

INFORME SEMANAL DE AVANCES FÍSICOS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA


DIRECCIÓN DE VIALIDADES (OBRAS ESTRATÉGICAS)

**OBRA No.
20190022**

“PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA MODAL (CETRAM) EN EL BOULEVARD ATLIXCÁYOTL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA”

CORTE AL 4 DE OCTUBRE DE 2019

INVERSIÓN Y PERIODOS DE EJECUCIÓN		PROGRAMA		OBSERVACIONES Y DIRECCIÓN RESPONSABLE	
INVERSIÓN TOTAL:	\$ 20,000,000.00	ESTATUS:	OBRA EN PROCESO	OBSERVACIONES:	1.- SE ESTAN COLOCANDO INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELÉCTRICAS EN EL EDIFICIO DE TAXIS Y AUTOBUSES FORÁNEOS. 2.- SE ESTÁ REALIZANDO LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON HUELLA PODOTÁCTIL.
FECHA DE INICIO REAL:	10/05/2019	% AVANCE FÍSICO DE OBRA:	64.58 %	DIRECCIÓN RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE VIALIDADES (OBRAS ESTRATÉGICAS)
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA:	1/10/2019				

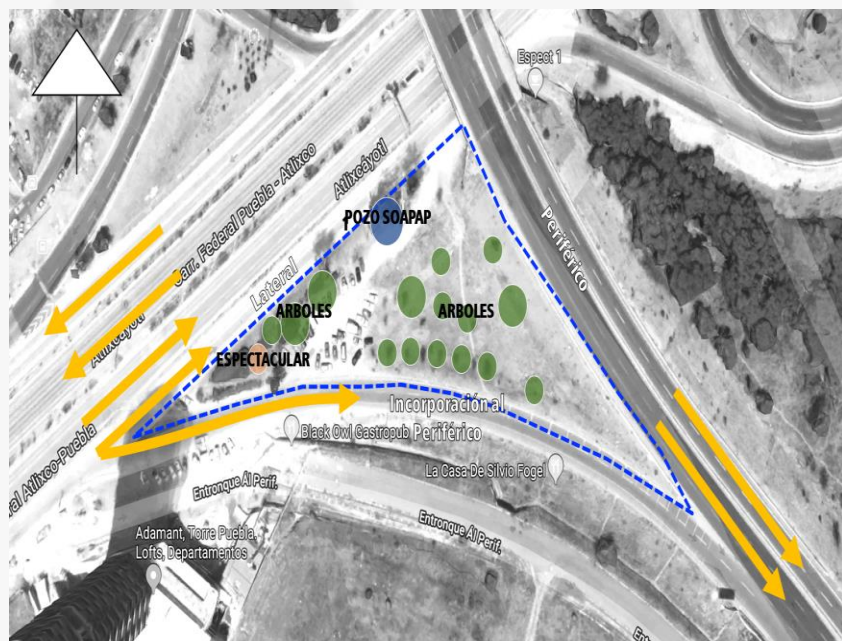

INFORME SEMANAL DE AVANCES FÍSICOS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE VIALIDADES (OBRAS ESTRATÉGICAS)

OBRA No.
20190022

"PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA MODAL (CETRAM) EN EL BOULEVARD ATLIXCÁYOTL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA"
CORTE AL 4 DE OCTUBRE DE 2019

